

รายงานการเบิกงบประมาณ และความก้าวหน้าลงทุน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ 30 เมษายน 2565

ERP

ENTERPRISE RESOURCE PLANNING



E



วงเงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565




งบแผ่นดิน

561,018,700 บาท



งบรายได้




370,656,400 บาท






งบภาพรวม

931,675,100 บาท



การตั้งเบิก งบประมาณ ภาพรวม

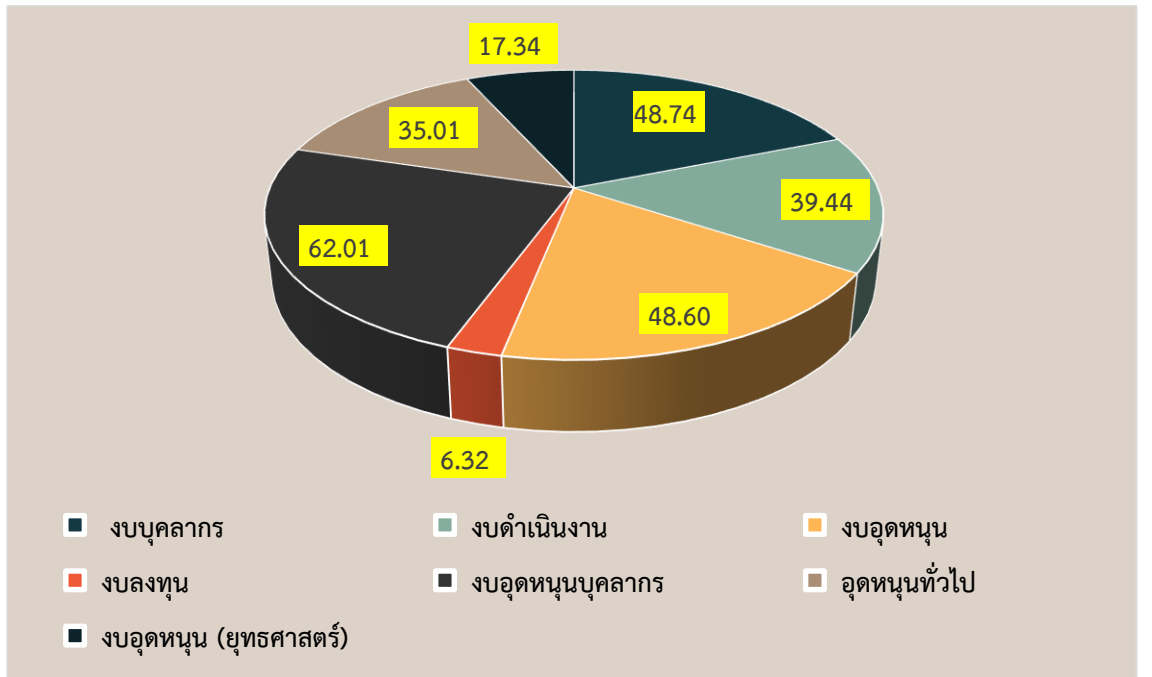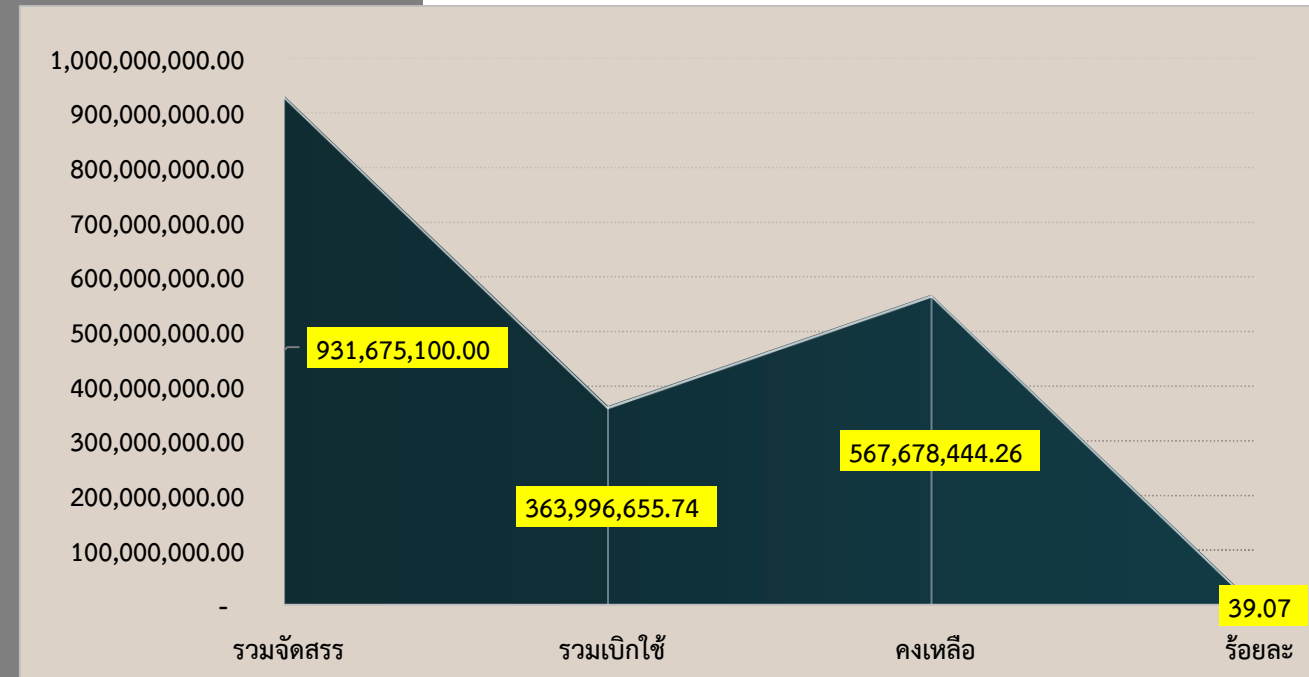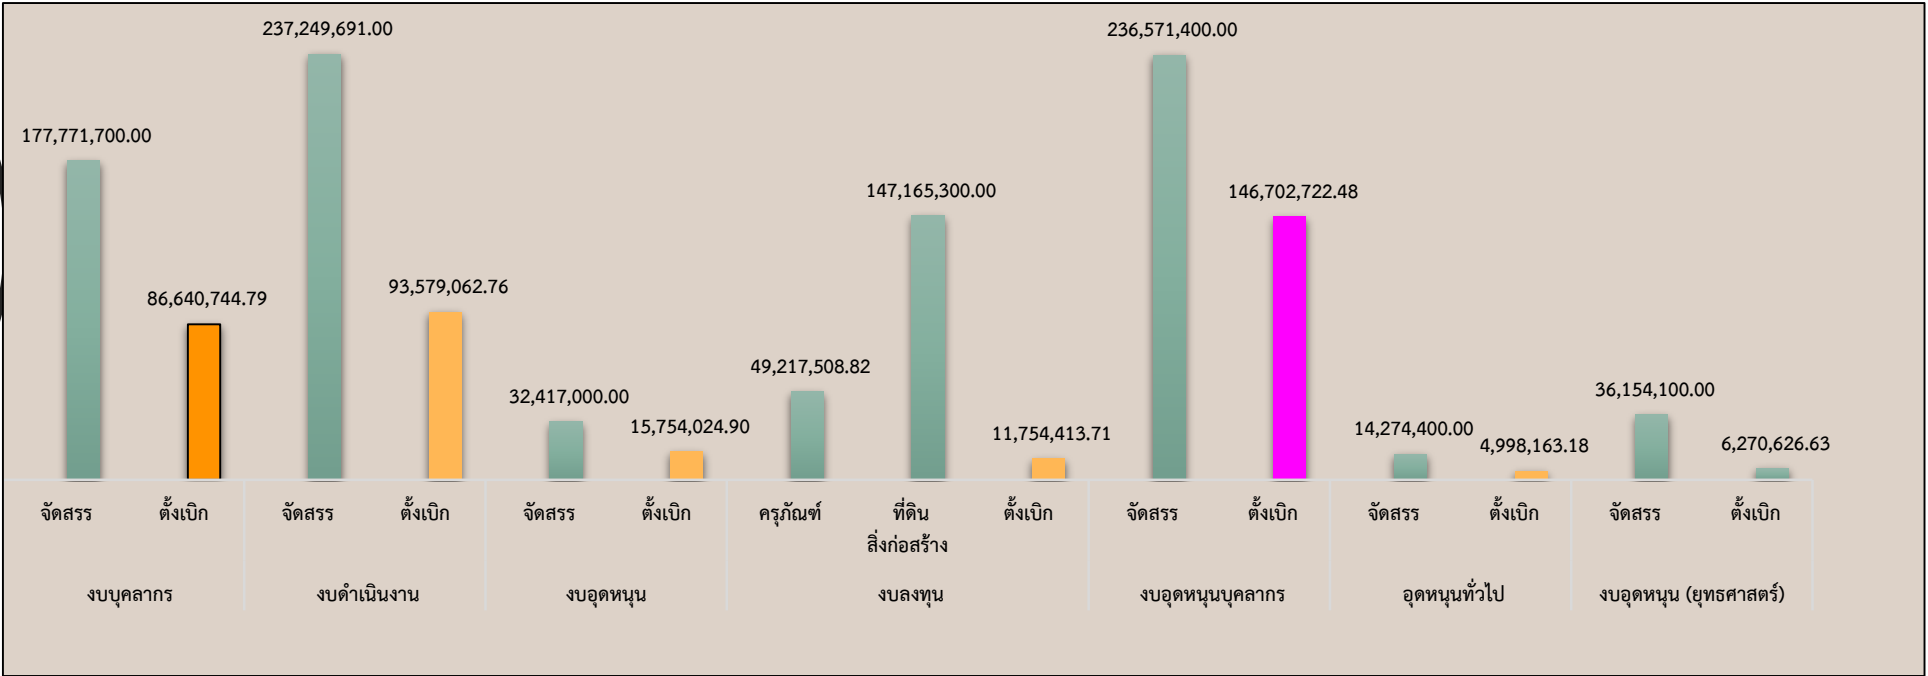


งบประมาณแผ่นดิน

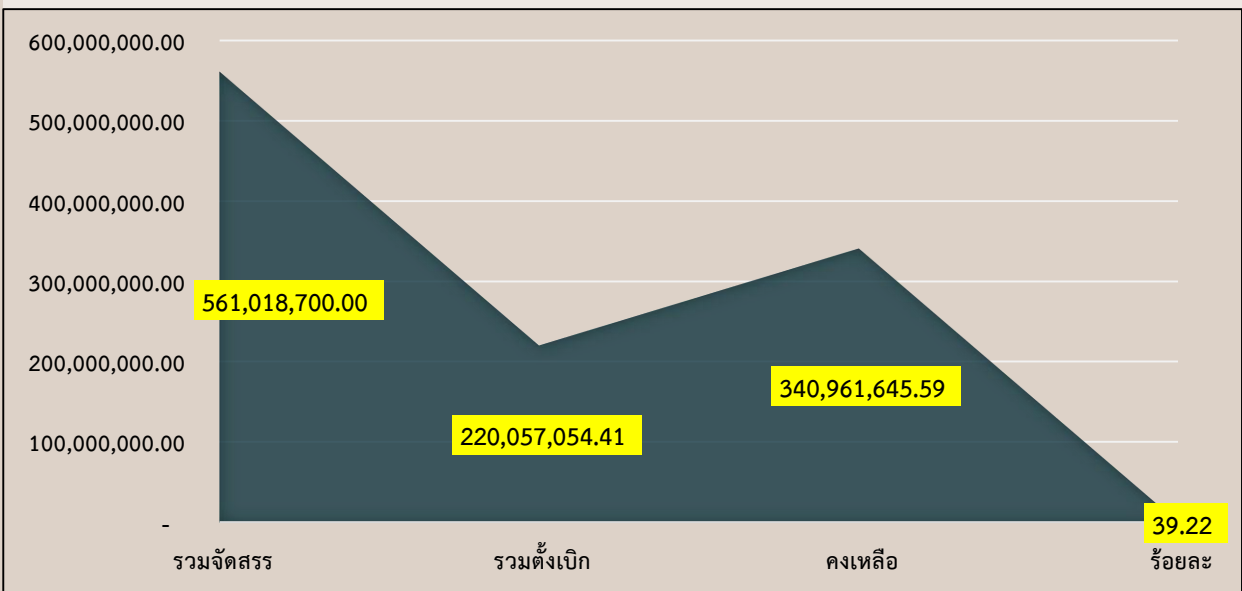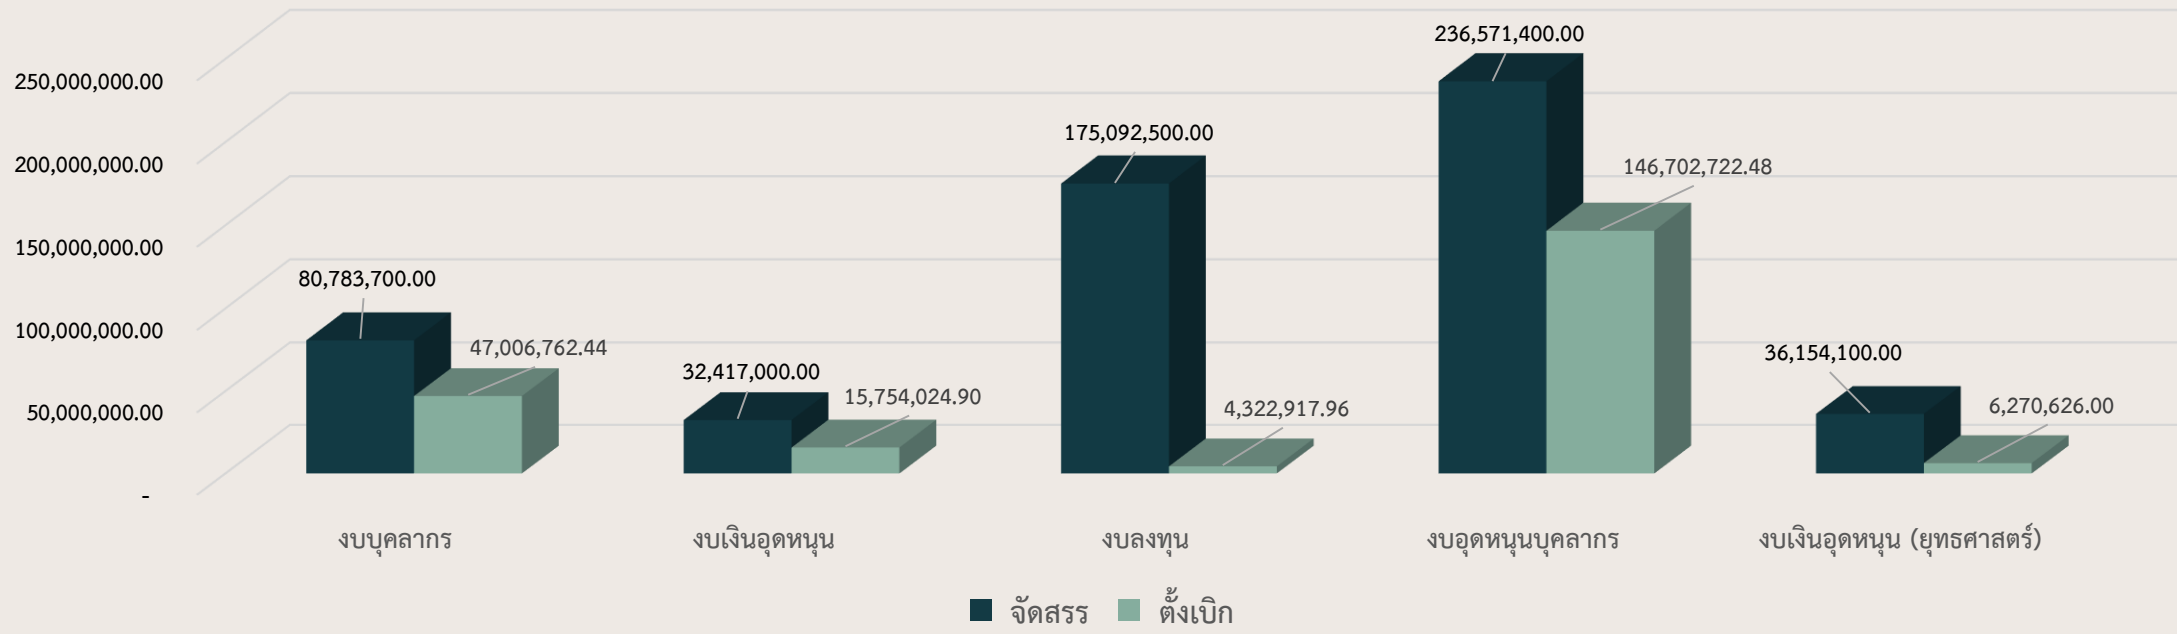


งบประมาณเงินรายได้

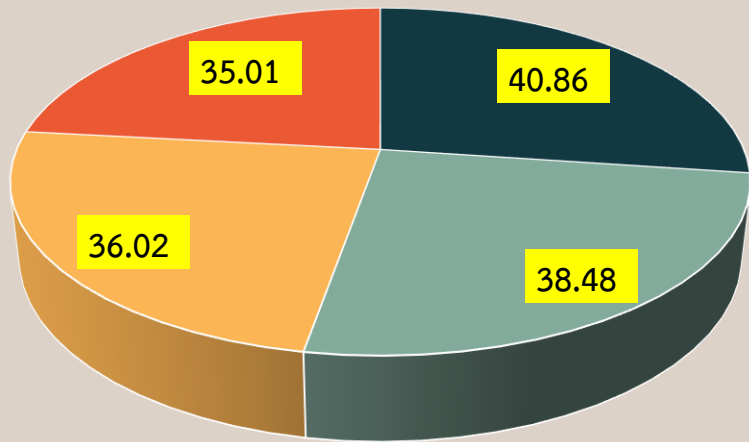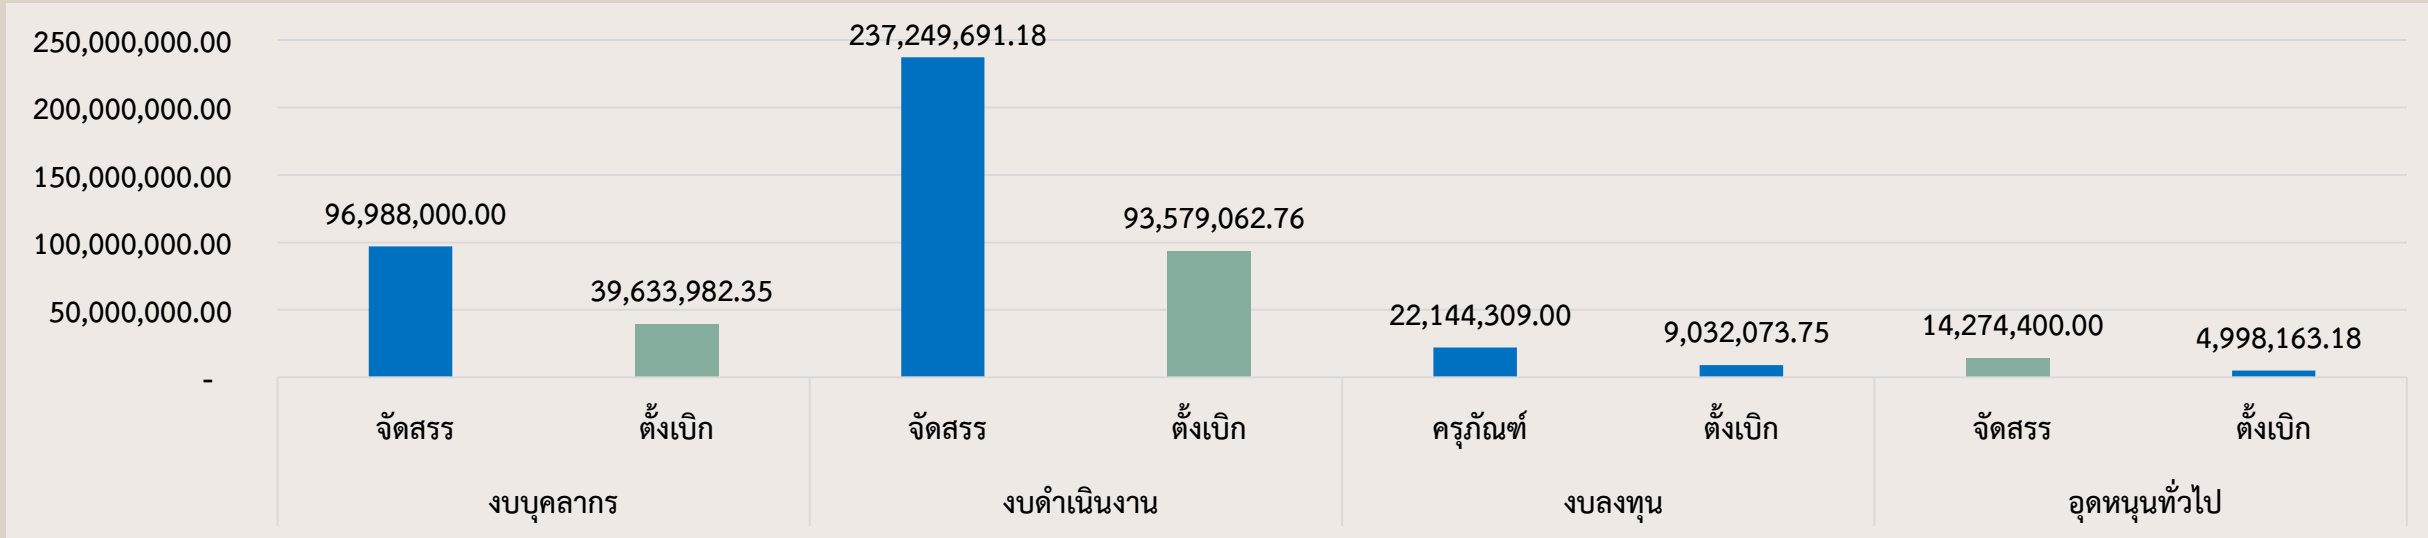

■ งบบุคลากร
 ■ งบดำเนินงาน
 ■ งบลงทุน
 ■ อุดหนุนทั่วไป

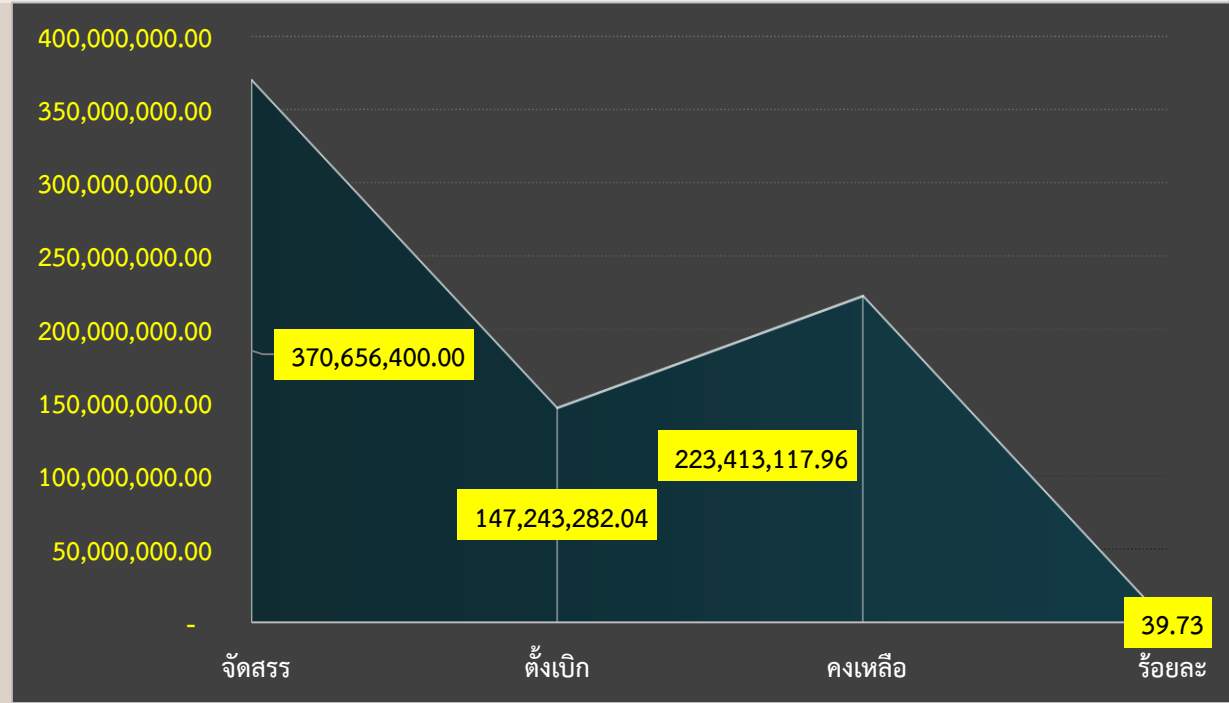

ร้อยละการเบิกงบประมาณภาพรวม

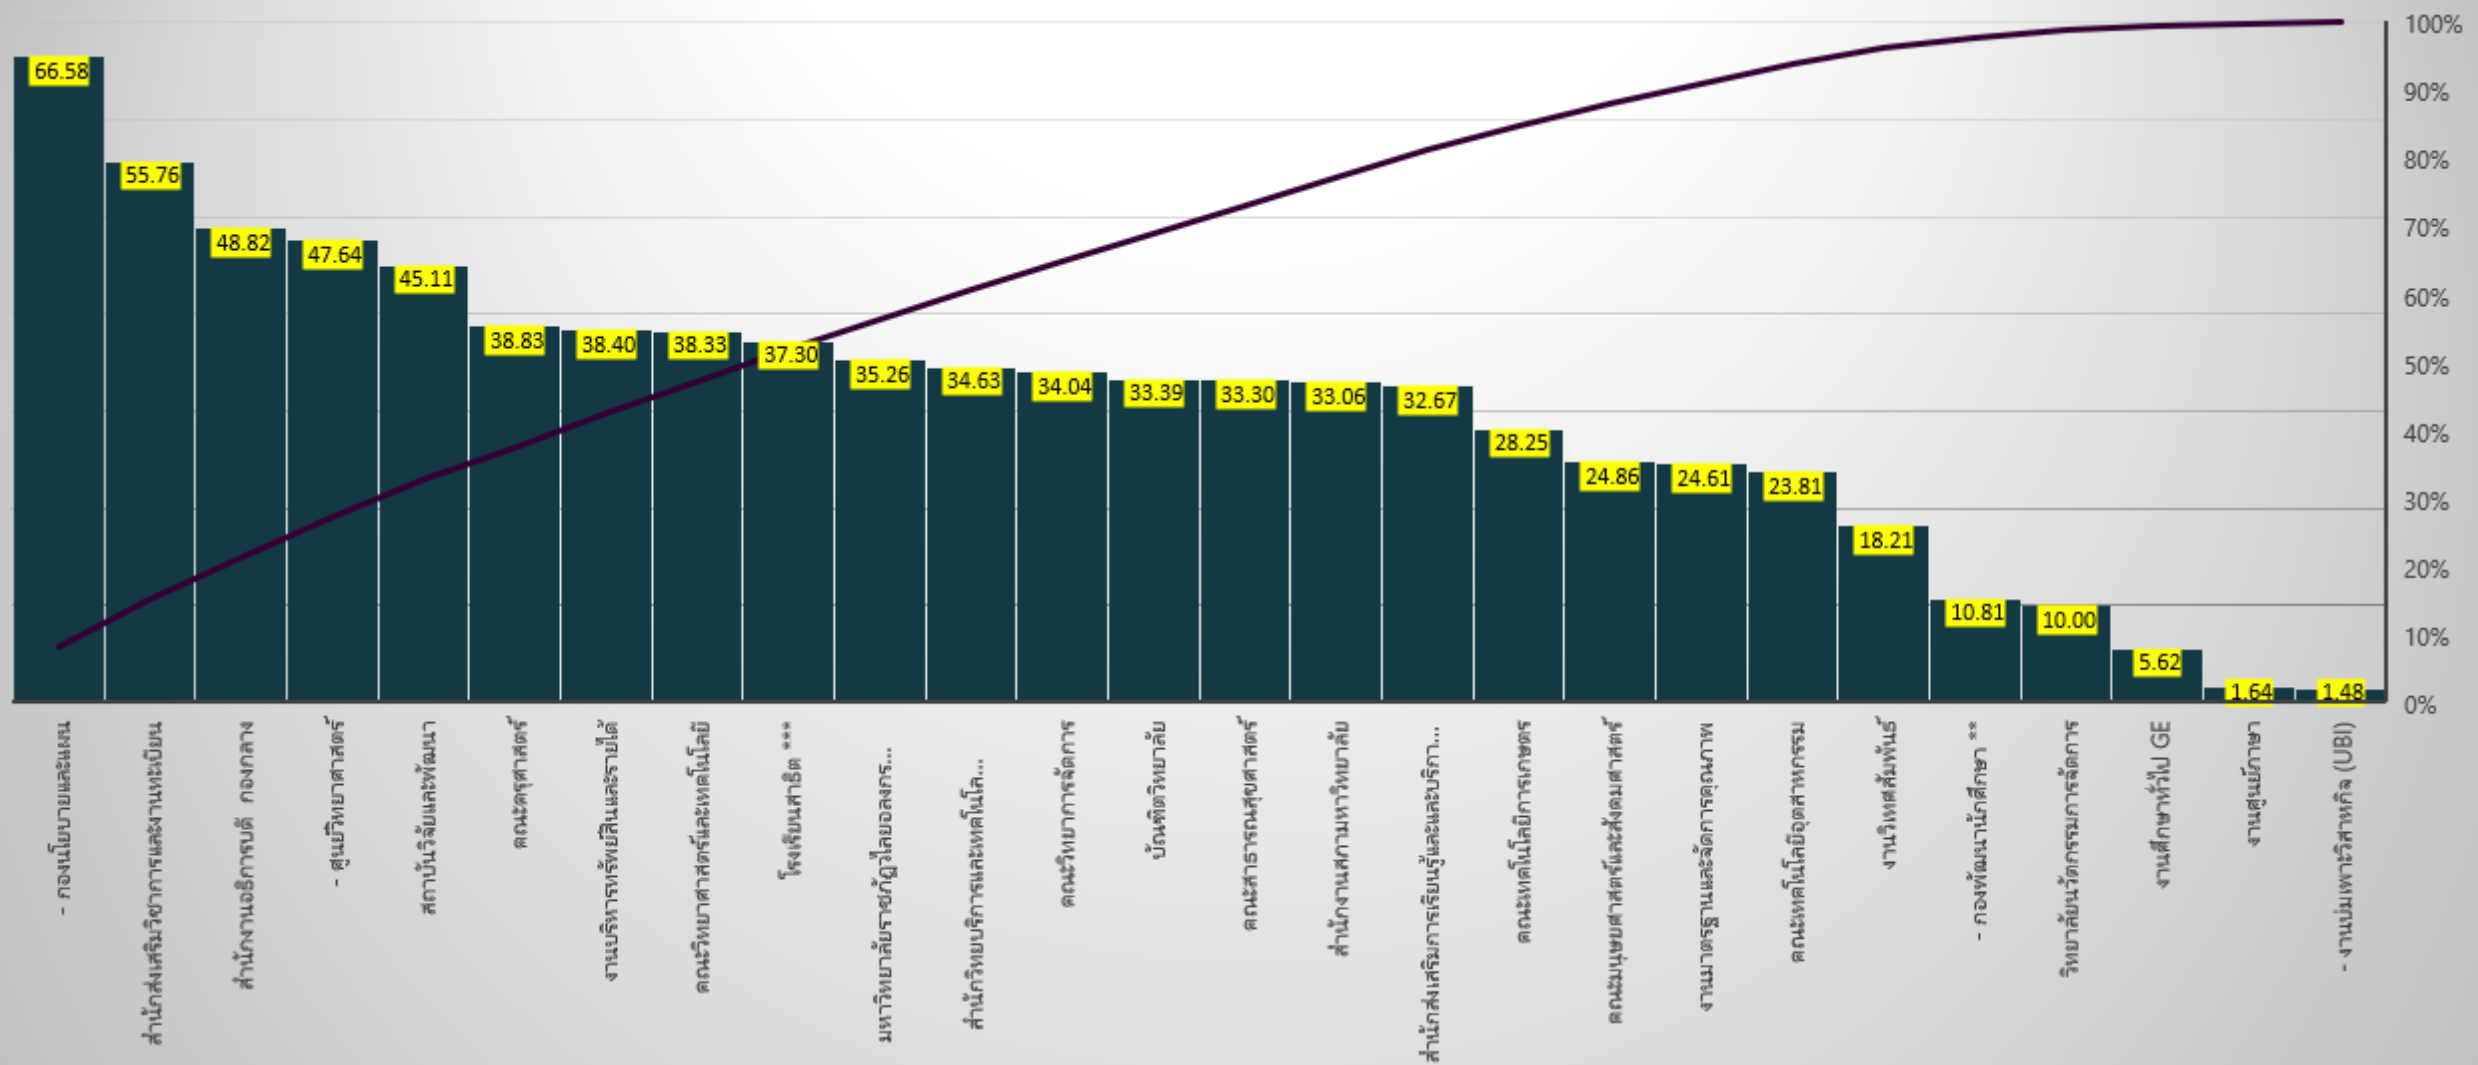

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 กรมบัญชีกลาง (ระบบ GF MIS)

ประเภท	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	เป้าหมาย ไตรมาส 2
รายจ่ายประจำ	36.46	46.70	54.63	57.00
รายจ่ายงบลงทุน	0.44	0.64	0.64	29.00
ภาพรวม	25.22	32.32	37.78	51.00
ลำดับที่	↓ 36	↓ 33	↑ 34	



เบิกได้มาก



เบิกได้น้อย



ลำดับเบิก 1

ความก้าวหน้าการลงทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ความก้าวหน้าของที่ดินและสิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564

	รายการ	วงเงินงบประมาณ พ.ร.บ	งบประมาณ พ.ศ.2565	ความคืบหน้า
	รายการขมูกพัน และงบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1 ปี แล้วเสร็จ			
	ขมูกพันเดิม			
1	ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์พร้อม ส่วนขยาย (ปี 2562) (ก่องนี้ 267,602,400 บาท)	300,000,000	65,529,600	เร่งรัดการดำเนินงาน ครั้งที่ 5
2	ปรับปรุงบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย (ปี 2564) (ก่องนี้ 79,505,786.88 บาท)	80,000,000	25,648,500	เร่งรัดการดำเนินงาน ครั้งที่ 5
	สิ่งก่อสร้าง 1 ปีแล้วเสร็จ (ปี 2564)			
1	ปรับปรุงพัฒนาอาคารปฏิบัติการด้าน Learning space (ก่องนี้ 16,759,618.65 บาท)	20,000,000.00	15,754,041.53	ดำเนินงานถึงงวดที่ 8 จาก 10 งวด
2	ปรับปรุงสนามกีฬากลางเพื่อสุขภาพ (ก่องนี้ 21,222,400 บาท)	25,000,000.00	15,704,576	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
3	ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (ก่องนี้ 4,341,495 บาท)	5,000,000.00	1,953,672.75	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
4	ก่อสร้างศูนย์จัดการความรู้การจัดการขยะชุมชน (ก่องนี้ 9,858,000 บาท)	10,000,000.00	5,914,800	ตรวจรับงานงวดสุดท้าย วันที่ 18 เมษายน 2565

ความก้าวหน้าของงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	วงเงินงบประมาณ พ.ร.บ	วงเงินก่อนนี้	ความคืบหน้า
	สิ่งก่อสร้าง 1 ปีแล้วเสร็จ	61,587,200		
1	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเรียนการสอน Active Learning	40,000,000	ลงนามในสัญญา 29 เมษายน 2565	
2	ปรับปรุงโรงยิมอาคารโรงเรียนสาธิตประถม	8,000,000	เริ่มดำเนินงาน 1 เมษายน 2565	
3	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสุขภาพ	13,587,200	เริ่มดำเนินงาน 1 เมษายน 2565	

ความก้าวหน้าของงบลงทุน **ครุภัณฑ์**

	รายการ	วงเงินงบประมาณ	การดำเนินงาน
	ผลผลิตด้านสังคมศาสตร์ ครุภัณฑ์ จำนวน 38 รายการ	14,978,000	
1.	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 28 รายการ		ส่งของ งวดที่ 1 จำนวน 12 รายการ (ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2565) งวดที่ 2 จำนวน 16 รายการ (ภายในวันที่ 6 กันยายน 2565)
2	โรงเรียนสาริต จำนวน 3 รายการ		1. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1 รายการ 2. เบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน 2565 จำนวน 2 รายการ
3	กองกลาง จำนวน 7 รายการ		1. ประกาศประกวดราคาครั้งที่ 2 จำนวน 3 รายการ 2. ร่างประกาศ TOR ครั้งที่ 2 จำนวน 4 รายการ
	ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ	6,840,400	
1	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 11 รายการ		1. ส่งมอบภายใน 23 มิถุนายน 2565 จำนวน 10 รายการ 2. เบิกจ่ายภายในเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 1 รายการ
2	คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 3 รายการ		ดำเนินการเบิกจ่ายครบแล้ว จำนวน 3 รายการ
	ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ	6,108,800	
	คณะสาธารณสุขศาสตร์		1. เบิกจ่าย จำนวน 2 รายการ 2. ระหว่างส่งของและการตรวจรับ จำนวน 6 รายการ 3. ระหว่างพิจารณาผล e-Bidding จำนวน 2 รายการ
	รวมงบ/ระบอบ	27,927,200	

จบการนำเสนอ



กองนโยบายและแผน

เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180



Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580



Email : saraban@vru.ac.th
